



Министерство на Здравеопазването

Инвестиция по Плана за възстановяване и устойчивост

Проектът включва:

8 медицински хеликоптера

6 постоянни оперативни бази



Целта е изграждане на национална мрежа за въздушна спешна медицинска помощ

Постоянните бази трябва да осигурят:

домуване на хеликоптерите

работно пространство за дежурните

медицински екипи

оперативна готовност при сигнал

Към момента

наличните хеликоптери

домуват във временни бази,

които също минават процедура

по лицензиране

Без бази системата не може да функционира

Хеликоптерите

Доставки:

1 доставен по ОП „Региони в растеж“

4 доставени по ПВУ

3 се очакват по ПВУ до юни 2026


Разпределение:

1 в София

2 в Сливен

1 в Долна Митрополия

1 в Балчик

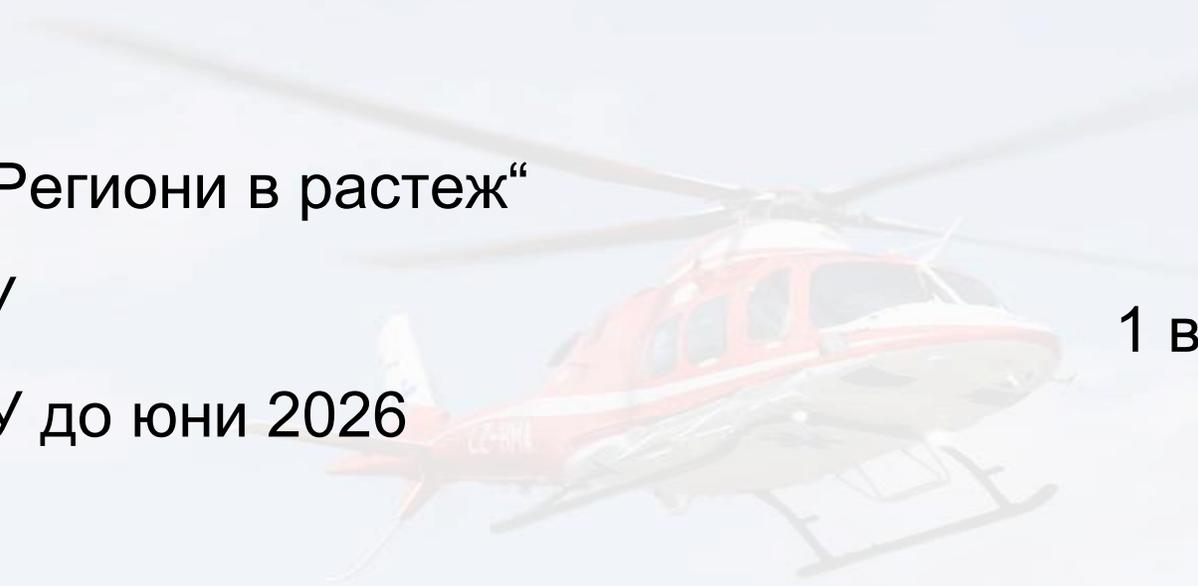

Бази

Част от процедурите са едва
на етап административна
подготовка

За базите няма разрешение
за строеж

На едно място дори няма
осигурен терен

**Две години след старта:
реалното строителство
на постоянните бази
не е започнало и те не
могат да бъдат
реализирани в заложените
срокове**

База Сливен

- издадена виза за проектиране
- съгласуване с ГВА
- решение на РИОСВ
- съгласуване с ВиК

Следва:

разрешение за строеж

База Монтана (Габровница)

- аеронавигационно обследване
- изготвен ПУП
- изготвен идеен проект
- решение на РИОСВ

Следва:

разрешение за строеж

База Търговище (Буховци):

- одобрен ПУП
- решение на РИОСВ
- изготвен идеен проект
- съгласуване с инфраструктурни оператори

Следва:

разрешение за строеж

База Долна Митрополия

- издадена виза за проектиране
- решение на РИОСВ
- съгласувания с институции

В момента:

съгласуване с ВиК и АПИ

Следва:

разрешение за строеж

База Пловдив

- проведена процедура
- последвало обжалване
- необходимо е ново възлагане

Следва:

Провеждане на нова поръчка за избор на изпълнител

Главна база София

- първоначалният терен е променен след аеронавигационно обследване
- изготвен е проект

В момента:

Новият терен е част от имот на Гранична полиция и е в ход процедура по предоставянето му

Етап на изпълнение



Министерство на
здравеопазването

*Терен за база в
с. Буховци, Община Търговище*



*Терен за база в
с. Габровница, Община Монтана*



*Терен за база в
гр. Сливен*



*Терен за база в
гр. Долна Митрополия*



Хеликоптери:



Бази:



Какво означава това?

Съществува реален риск от провал на инвестицията по ПВУ и загуба на средствата за базите (6,3 милиона евро) и за хеликоптерите (над 80 милиона евро)

Предложение до Европейската комисия изграждането на базите да бъде изведено от ПВУ, за да избегнем загубата на над 80 милиона за хеликоптерите

Създаването на базите с държавно финансиране

Нов план-график за изграждането им с ясни срокове

Конкретни стъпки за развитие на спешната

медицинска помощ по въздух

